

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIMILPAN 2016 - 2018



**TIMILPAN**

2016 - 2018

*Subcomité de Rendición de Cuentas*

"2018. AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE IGNACIO RAMIREZ CALZADA, EL NIÑOMANTE"

**TIMILPAN, MEX. A 05 DE JULIO DEL 2018  
TIM/TM/106/2018**

**MTRA. AZALEA DEL CARMEN CLEMENTE BLANCO  
DIRECTORA GENERAL DE INVERSION  
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO  
P R E S E N T E**


Por medio de la presente envió a usted el reporte de avance Físico-Financiero del Ramo 33 correspondiente al mes de JUNIO del 2018 a efecto de dar cumplimiento al artículo 240 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, a los lineamientos generales de operación de los Fondos para Infraestructura Social Municipal y de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

Sin más por el momento quedo de Usted, enviándole un cordial saludo.

**A T E N T A M E N T E**



**TESORERA, DANIEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ  
TESORERO MUNICIPAL**

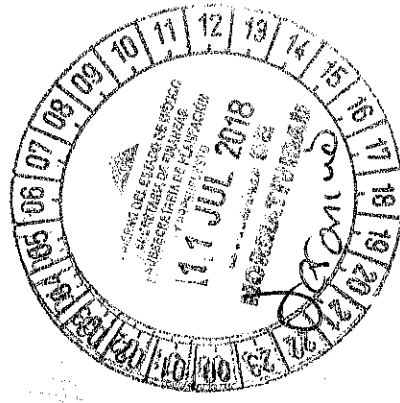

C.P. ARCHIVO

**PALACIO MUNICIPAL SIN PLAZA HIDALGO, COL. CENTRO, TIMILPAN, ESTADO DE MEXICO.,  
C.P. 50500, TELS. (01712) 12-5-50-27 712-12-5-50-29, Email:ha\_timilpan@hotmail.com**



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros


(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 102 TIMILPAN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2018. INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 15,175,113.00 REINTEGRO: \$ 0.00



Datos de la Obra y/o Acción							Fec. In. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Avances					
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. In. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
18124/000126588	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248	TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	ADMINISTRACION	2018-03-12	2018-04-13	266,000.00	266,000.00	0.00	242,832.43	242,832.43	0.00	02 METRO CUADRADO	540.00		5 ALUMNO		228	86	91.64	
18127/000226740	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181	ELECTRIFICACION	CONTRATO	2018-04-09	2018-04-12	575,000.00	575,000.00	0.00	349,177.75	349,177.75	0.00	17 PIEZA	8.00		3 POBLADO	1	2,350	90	60.73	
18128/000327035	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248	TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONTRATO	2018-03-12	2018-04-13	800,000.00	800,000.00	0.00	560,276.43	560,276.43	0.00	02 METRO CUADRADO	480.00		5 ALUMNO	1	134	90	70.03	
18132/000427223	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181	ELECTRIFICACION	CONTRATO	2018-04-05	2018-05-05	336,000.00	336,000.00	0.00	267,630.48	267,630.48	0.00	17 PIEZA	6.00		3 POBLADO	1	1,306	95	79.65	
18134/000527308	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	206	PREESCOLAR (SANITARIOS)	CONTRATO	2018-03-12	2018-04-13	200,000.00	200,000.00	0.00	31,800.00	31,800.00	0.00	02 METRO CUADRADO	23.00		5 ALUMNO	25	25	90	15.90	
18137/000627415	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	211	PRIMARIA (AULAS)	ADMINISTRACION	2018-03-09	2018-05-30	500,000.00	500,000.00	0.00	499,784.25	499,784.25	0.00	02 METRO CUADRADO	184.80		5 ALUMNO	1	403	90	99.96	
18157/000828148	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	016	CAMINOS RURALES	ADMINISTRACION	2018-04-02	2018-04-25	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	01 METRO LINEAL	500.00		3 POBLADO	1	150	100	100.00	
18159/000928199	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	016	CAMINOS RURALES	ADMINISTRACION	2018-04-02	2018-04-30	82,000.00	82,000.00	0.00	66,650.00	66,650.00	0.00	01 METRO LINEAL	800.00		3 POBLADO	1	256	100	81.28	
18653/001033500	16 OTP	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	287	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: BORDOS	ADMINISTRACION	2018-04-24	2018-05-26	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	9,800.00		3 POBLADO	1	120	0	0.00	
18676/001134027	16 OTP	UR URBANIZACION	B AMPLIACION COMPLEMENTARIOS	269	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CANALES	ADMINISTRACION	2018-04-24	2018-05-25	65,000.00	65,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	01 METRO LINEAL	150.00		6 PRODUCTOR	1	135	90	27.69	
19066/001210201	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	266	DRENAJE SANITARIO	CONTRATO	2018-03-05	2018-12-22	1,950,092.60	1,950,092.60	0.00	1,170,056.56	1,170,056.56	0.00	01 METRO LINEAL	5,991.73		3 POBLADO	6	3,889	60	60.00	



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33


Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 102 TIMILPAN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2018. INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018

Reporte de Ejercicio Acumulado



TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 15,175,113.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Datos de la Obra y/o Acción				Mod. Ejec.	Fec. Inic. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales		Beneficiarios		Avances		
		Programa	SubPrograma	Proyecto	Obra/Localidad		Fec. Inic. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	Beneficiarios		Personas	
19087/001348395	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE LAS REDES DE DRENAJE SANITARIO EN LA TERCERA MANZANA DE LA LOCALIDAD DE RINCON DE BUCIO SEGUNDA ETAPA / RINCON DE BUCIO (SAN ISIDRO)	ADMINISTRACION	2018-04-15	2018-05-05	250,000.00	250,000.00	0.00	161,769.16	161,769.16	0.00	01 METRO LINEAL	300.00	3 POBLADO	1	80	64.71	
19966/001476236	17 URB	UR URBANIZACION	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	016 CAMINOS RURALES	REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE MORELOS / BARRIO MORELOS	ADMINISTRACION	2018-05-22	2018-06-04	290,000.00	290,000.00	0.00	276,320.20	276,320.20	0.00	01 METRO LINEAL	3,000.00	2 COLONIA	1	650	95.28	
20263/0015102839	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	016 CAMINOS RURALES	MODERNIZACION DE CAMINO PRINCIPAL A LA PRIMERA MANZANA DE CAÑADA DE LOBOS / CAÑADA DE LOBOS (IRA, MZA. DE C. DE LOBOS)	CONTRATO	2018-06-04	2018-06-07	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	299,738.80	299,738.80	0.00	02 METRO CUADRADO	1,840.00	3 POBLADO	1	208	29.97	
20523/0016140757	17 URB	UR URBANIZACION	B AMPLIACION COMPLEMENTARIOS	251 CAMINOS/ CARRETERAS	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTIAGUITO MAXDA BO QUINTO DE MAXDA ENZDA DEL KM 0+000 AL KM 3+807, TRAMO A MODERNIZAR 0+000 AL 0+225 / SANTIAGUITO MAXDA	CONTRATO	2018-06-20	2018-08-31	314,000.00	314,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	04 KILOMETRO	225.00	2 COLONIA	1	385	0.00	
20524/0017141490	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGUITO MAXDA ETAPA DOS / SANTIAGUITO MAXDA	CONTRATO	2018-06-20	2018-08-31	570,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	1,130.00	2 COLONIA	1	245	0.00	
20525/0018141825	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TERCERA MANZANA DE ZARAGOZA ETAPA I / ZARAGOZA	CONTRATO	2018-06-20	2018-08-31	286,000.00	286,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	2,000.00	2 COLONIA	1	428	0.00	
20526/0019142215	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL PARAJE DENOMINADO LAMBA LA LOCALIDAD DE PRIMERA MANZANA DE ZARAGOZA / ZARAGOZA	CONTRATO	2018-06-20	2018-08-31	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	480.00	2 COLONIA	1	123	0.00	
20543/0020143965	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO IV DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGUITO MAXDA / SANTIAGUITO MAXDA	CONTRATO	2018-06-21	2018-07-31	395,000.00	395,000.00	0.00	254,548.09	254,548.09	0.00	01 METRO LINEAL	217.00	2 COLONIA	1	75	64.44	
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO (1)									TOTAL	8,238,092.60	8,238,092.60	0.00	4,243,563.15	4,243,563.15	0.00					1172	

Complementarios: 11      Directa: 8

